RELATÓRIO TÉCNICO

Acompanhamento Semanal

Desenvolvimento (DEV)

Semana de 09/11/26 a 13/11/26

Nº RS-DEV-2026-S46

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Documento	**RS-DEV-2026-S46**
Área	Desenvolvimento (DEV)
Período de referência	09/11/26 a 13/11/26
Foto do painel utilizada	09/11/26
Comparado com	semana de 02/11/26 a 06/11/26
Elaborado por	Mariana Coutinho - Supervisão de desenvolvimento
Destinatário	Gestor da área
Data de emissão	09/11/2026
Classificação	Uso interno
Situação geral	FORA DA META

SUMÁRIO

1. SUMÁRIO EXECUTIVO 4

2. APRESENTAÇÃO E METODOLOGIA 4

2.1 Objetivo 4

2.2 Fontes de dados 4

2.3 Metodologia 4

3. INDICADORES DO PAINEL 5

3.1 Comparativo com a semana anterior 5

3.2 Evolução semanal 5

3.3 Distribuição do ritmo das demandas 6

4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 6

4.1 Estatística descritiva da série histórica 6

5. EXECUÇÃO DO PLANO DA SEMANA 7

5.1 Situação dos itens 7

5.2 Prazo das entregas e capacidade 8

5.3 Causas dos itens não concluídos (Pareto) 8

5.4 Itens não concluídos 8

6. DESEMPENHO POR PESSOA 8

6.1 Resultado individual 8

6.2 Ritmo das demandas por responsável 9

6.3 Maior dificuldade relatada 9

7. CONSTATAÇÕES DA SEMANA 9

8. FRENTES DE TRABALHO E DORES 10

9. PONTOS DE ATENÇÃO 11

9.1 Plano além do que o painel espera 11

9.2 Demandas em risco, atrasadas ou com previsão vencida 11

10. RISCOS E PLANO B 11

11. COMPROMISSOS COM A GESTÃO 11

12. CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS 12

12.1 Destaques da semana 12

12.2 Decisões e apoio necessários da gestão 12

ANEXO A - PLANO DETALHADO DA SEMANA 13

ANEXO B - MOVIMENTO DOS CARDS 13

ANEXO C - GLOSSÁRIO DOS INDICADORES 14

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

FORA DA META Situação geral da semana: 70% dentro do prazo para uma meta de 85%.

Resumo.

Tabela 1 - Quadro-resumo dos indicadores-chave

Indicador	Semana anterior	Esta semana	Variação
Dentro do prazo	68%	**70%**	+2 pp
Concluídos no cronograma	118	**125**	+7
Eficiência da área	89	**91**	+2
Itens do plano feitos	4/6	**3/7**	-24 pp
Itens alterados	2	**3**	+1
Continuidade no cronograma	75%	**75%**	=

Fonte: painel do gestor e plano da supervisão.

Principais constatações

1. Dentro do prazo em 70% (+2 pp na semana), 15 pp abaixo da meta de 85%.
2. Demandas em risco subiram de 9 para 11.
3. Plano da semana: 3 de 7 itens feitos (43%), contra 67% na semana anterior.
4. 75% das entregas (3 de 4) ficaram dentro da previsão do card.
5. 3 itens tiveram data mudada ou foram adiados; causa mais citada: dependência externa (1).

2. APRESENTAÇÃO E METODOLOGIA

2.1 Objetivo

Este relatório registra o acompanhamento semanal da área de Desenvolvimento (DEV) no período de 09/11/26 a 13/11/26: a situação dos indicadores do painel do gestor, a execução do plano da semana, os riscos e os compromissos assumidos com a gestão, comparando com a semana anterior e com o histórico disponível.

2.2 Fontes de dados

- Painel do gestor: foto de 09/11/26, com 8 cards e 17 indicadores lidos.
- Plano da semana da supervisão: 7 itens planejados, confirmado em 09/11/26, ainda não fechado.
- Histórico: 5 fotos do painel e 2 planos semanais registrados.

2.3 Metodologia

- Os números do painel são usados exatamente como aparecem, sem recálculo.
- Para séries históricas é usada uma foto por semana: a mais recente da semana.
- As estatísticas são descritivas (média, mediana, desvio- padrão amostral, mínimo e máximo); a tendência é a inclinação da reta de mínimos quadrados por semana.

- Faixa usual de um indicador = média mais ou menos um desvio-padrão; só é avaliada com três semanas ou mais.
- Prazos do plano são comparados com a previsão e o vencimento do card no painel; desvios de entrega são contados em dias úteis.

3. INDICADORES DO PAINEL

3.1 Comparativo com a semana anterior


Tabela 2 - Indicadores do painel: semana de 02/11 x semana de 09/11

Indicador	Anterior	Atual	Variação	Var. %
Dentro do prazo (%)	68%	**70%**	+2 pp	–
Meta do painel (%)	85%	**85%**	=	–
Itens no cronograma	212	**212**	=	=
Concluídos	118	**125**	+7	+5,9%
Concluídos (%)	56%	**59%**	+3 pp	–
Concluídas no período	104	**110**	+6	+5,8%
Demandas em andamento	37	**37**	=	=
Ritmo: no ritmo	27	**28**	+1	+3,7%
Ritmo: em risco	9	**11**	+2	+22,2%
Ritmo: atrasadas	5	**3**	-2	-40%
Atrasados (vencimento passou)	3	**1**	-2	-66,7%
Vencem em até 15 dias	25	**25**	=	=
Eficiência da área	89	**91**	+2	+2,2%
Eficiência: prazo	85	**87**	+2	+2,4%
Eficiência: vazão	90	**90**	=	=
Eficiência: qualidade	99	**99**	=	=

Fonte: painel do gestor.


3.2 Evolução semanal

Figura 1 - Dentro do prazo (%) por semana, com a meta do painel

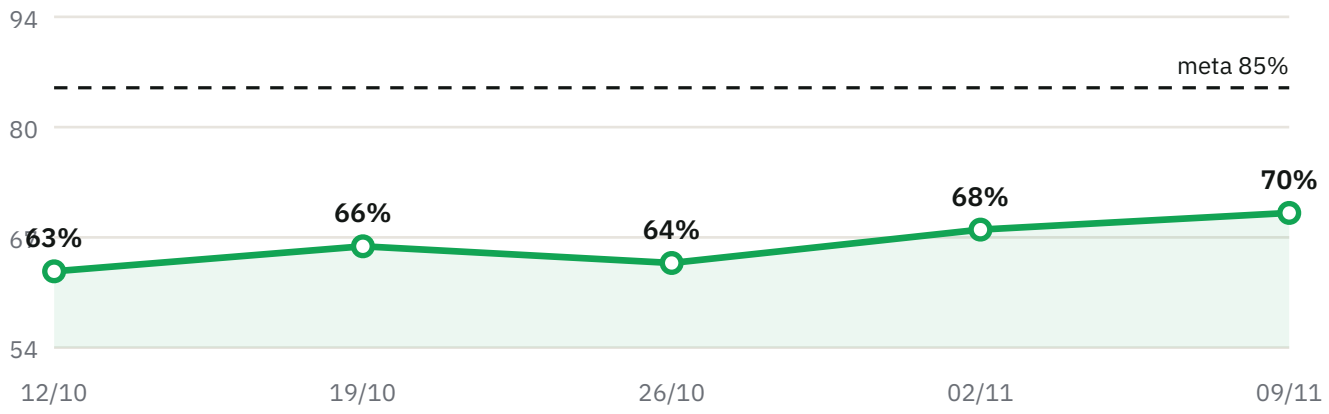

Fonte: painel do gestor.

Figura 2 - Itens concluídos no cronograma por semana

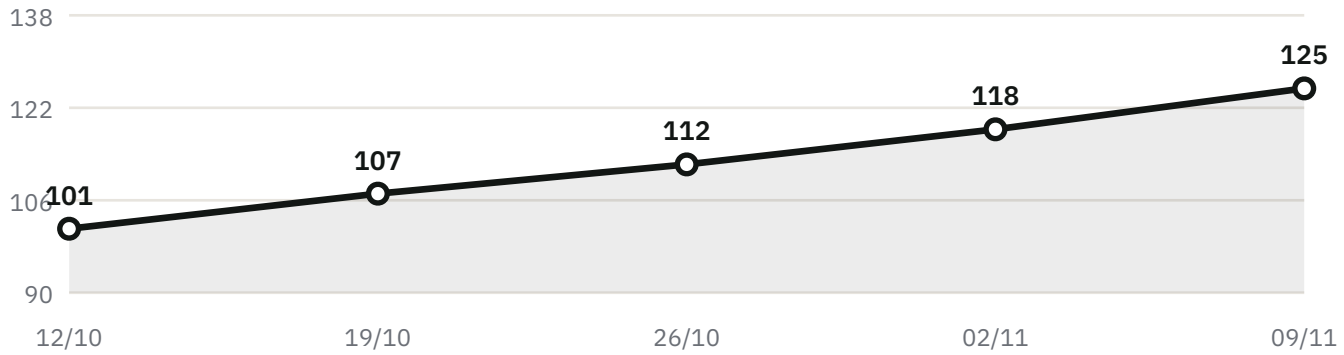

Fonte: painel do gestor.

3.3 Distribuição do ritmo das demandas

Tabela 3 - Demandas em andamento por ritmo

Ritmo	Quantidade	Participação
no ritmo	28	66,7%
em risco	11	26,2%
atrasadas	3	7,1%
Total	**42**	**100%**

Fonte: painel do gestor.

4. ANÁLISE ESTATÍSTICA

4.1 Estatística descritiva da série histórica

Série de 5 semanas até a semana de 09/11/26.

Tabela 4 - Estatísticas descritivas por indicador

Indicador	n	Média	Mediana	DP	Mín / Máx	Tend./sem	Atual
Dentro do prazo (%)	5	66,2%	66%	2,9	63 / 70	+1,6	70% (acima)
Concluídos	5	112,6	112	9,3	101 / 125	+5,9	125 (acima)
Concluídas no período	5	99,6	99	7,8	90 / 110	+4,9	110 (acima)
Demandas em andamento	5	38,4	38	1,7	37 / 41	-1	37
Ritmo: no ritmo	5	27,2	27	0,4	27 / 28	+0,2	28 (acima)
Ritmo: em risco	5	9,4	9	1,1	8 / 11	+0,3	11 (acima)
Ritmo: atrasadas	5	5,4	6	1,5	3 / 7	-0,9	3 (abaixo)
Atrasados (vencimento passou)	5	2,6	3	0,9	1 / 3	-0,4	1 (abaixo)
Eficiência da área	5	87,6	88	2,7	84 / 91	+1,7	91 (acima)
Plano: % de itens feitos	2	55%	55%	17	43 / 67	-24	43%

Fonte: painel do gestor (uma foto por semana) e planos da supervisão.

Leitura dos resultados

- Dentro do prazo (%): o valor atual (70%) está acima da faixa usual (63,3% a 69,1%).
- Dentro do prazo (%): tendência de alta de 1,6 pp por semana (favorável).
- Concluídos: o valor atual (125) está acima da faixa usual (103,3 a 121,9).
- Concluídos: tendência de alta de 5,9 por semana (favorável).
- Concluídas no período: o valor atual (110) está acima da faixa usual (91,8 a 107,4).
- Concluídas no período: tendência de alta de 4,9 por semana (favorável).
- Demandas em andamento: tendência de queda de 1 por semana (favorável).
- Ritmo: no ritmo: o valor atual (28) está acima da faixa usual (26,8 a 27,6).
- Ritmo: em risco: o valor atual (11) está acima da faixa usual (8,3 a 10,5).
- Ritmo: atrasadas: o valor atual (3) está abaixo da faixa usual (3,9 a 6,9).
- Ritmo: atrasadas: tendência de queda de 0,9 por semana (favorável).
- Atrasados (vencimento passou): o valor atual (1) está abaixo da faixa usual (1,7 a 3,5).
- Eficiência da área: o valor atual (91) está acima da faixa usual (84,9 a 90,3).
- Eficiência da área: tendência de alta de 1,7 por semana (favorável).

5. EXECUÇÃO DO PLANO DA SEMANA

5.1 Situação dos itens

Tabela 5 - Itens do plano por situação

Situação	Itens	Participação
a fazer	3	37,5%
feito	4	50%
adiado	1	12,5%

Situação	Itens	Participação
Total	**8**	**100%**

Fonte: plano da supervisão.

5.2 Prazo das entregas e capacidade

Tabela 6 - Indicadores de execução

Indicador	Valor
Entregas no prazo combinado	3 de 4 (75%)
Desvio médio de entrega (dias úteis)	-0,2
Desvio mediano de entrega (dias úteis)	=
Maior atraso de entrega (dias úteis)	1
Continuidade no cronograma do painel	3 de 4 (75%)
Itens não planejados feitos	1
Horas planejadas / capacidade	60h / 80h (75%)

Fonte: plano da supervisão e painel do gestor.

5.3 Causas dos itens não concluídos (Pareto)

Tabela 7 - Causas por frequência

Causa	Itens	%	% acumulado
Dependência externa	1	100%	100%

Fonte: fechamento do plano.

5.4 Itens não concluídos

Tabela 8 - Itens que não saíram e motivo

Responsável	Item	Situação	Causa	Motivo
Douglas	**DEV-222** Levantamento de requisitos	adiado	Dependência externa	Aguardando log do cliente

Fonte: fechamento do plano.

6. DESEMPENHO POR PESSOA

6.1 Resultado individual


Tabela 9 - Plano, entregas e carga por pessoa

Pessoa	Feitos	% feito	Anterior	Alterados	Horas / cap.	Utiliz.	Alertas
Rodrigo Cinelli	1/2	**50%**	100%	1	16h / 40h	40%	1
Douglas Cerqueira	1/2	**50%**	50%	1	0h / 40h	0%	0

Pessoa	Feitos	% feito	Anterior	Alterados	Horas / cap.	Utiliz.	Alertas
Mariana Coutinho	1/3	**33%**	50%	1	44h / 40h	**110%**	2

Fonte: plano da supervisão.

Figura 3 - % do plano feito por pessoa: semana anterior x esta semana

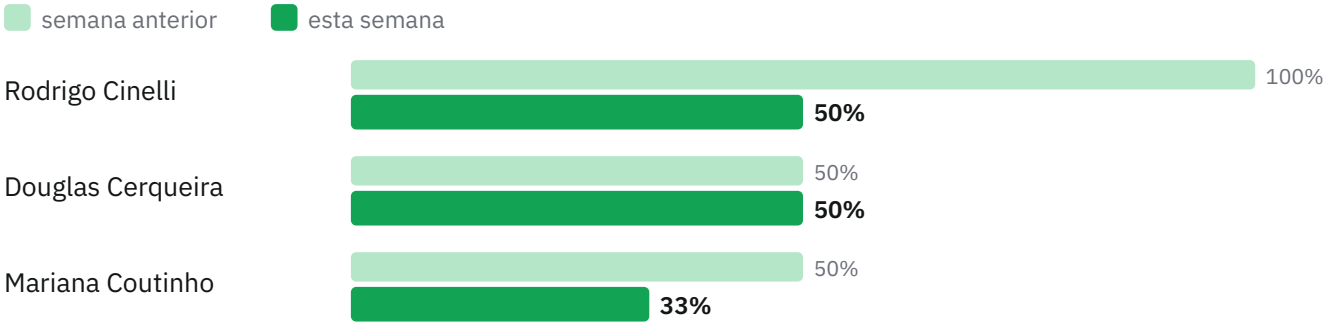

Fonte: plano da supervisão.

6.2 Ritmo das demandas por responsável

Figura 4 - Demandas em execução por ritmo (verde: no ritmo; amarelo: em risco; vermelho: atrasado; cinza: sem ritmo)



Fonte: painel do gestor.

6.3 Maior dificuldade relatada

Tabela 10 - Dificuldades por pessoa

Pessoa	Dificuldade
Rodrigo Cinelli	Acesso ao ambiente de produção para checar os envios.
Douglas Cerqueira	Esperando log do cliente para os alertas.
Mariana Coutinho	Três frentes em paralelo; DEV-198 depende de definição do cliente.

Fonte: plano da supervisão.

7. CONSTATAÇÕES DA SEMANA

Constatações geradas por regras a partir dos números do painel e do plano, comparando com a semana anterior.

Pontos que pedem atenção

- Dentro do prazo em 70% (+2 pp na semana), 15 pp abaixo da meta de 85%.
- Demandas em risco subiram de 9 para 11.
- Plano da semana: 3 de 7 itens feitos (43%), contra 67% na semana anterior.
- 75% das entregas (3 de 4) ficaram dentro da previsão do card.

- 3 itens tiveram data mudada ou foram adiados; causa mais citada: dependência externa (1).
- Mariana Coutinho está com 44h planejadas para 40h de capacidade.
- Mariana Coutinho concentra 2 alertas de entrega além do que o painel espera.
- Sem avanço de etapa desde 02/11: DEV-222, DEV-219, DEV-198, DEV-223 e mais 2.
- Pioraram de ritmo: DEV-198 (no ritmo para em risco).
- O painel mudou a previsão de 1 card: DEV-207 (06/11 para 11/11).
- 1 de 2 compromissos da semana anterior cumpridos.

Pontos positivos

- 7 itens concluídos no cronograma desde 02/11 (de 118 para 125).
- Demandas atrasadas no ritmo caíram de 5 para 3.
- 2 cards avançaram 5 etapas no total desde 02/11.

Outras observações

- 1 item não planejado entrou e foi feito.
- Saíram da execução (concluídos ou pausados): DEV-150.
- Time atuando em 7 frentes e 4 dores; Agendamento tem mais de uma pessoa.

8. FRENTES DE TRABALHO E DORES

Tabela 11 - Matriz de frentes por pessoa

Frente	Rodrigo	Douglas	Mariana
Acesso	sem card Correção urgente no login		
Agendamento	DEV-219 Concluir	DEV-218 Concluir testes	
Alertas		DEV-222 Levantamento de requisitos	
CIPA			DEV-040 Concluir modelagem
Cronogramas			DEV-223 Front-end
Integrações	DEV-207 Concluir implementação		
Portal do funcionário			DEV-198 Concluir modelagem

Fonte: plano da supervisão.

Tabela 12 - Dores atacadas na semana

Dor	Onde e quem
CPF inválido trava o agendamento	DEV-219 (Rodrigo), DEV-218 (Douglas)
Alertas acumulados	DEV-222 (Douglas)
Funcionário não vê os próprios exames	DEV-198 (Mariana)
Retrabalho no PCMSO	DEV-223 (Mariana)

Fonte: plano da supervisão.

9. PONTOS DE ATENÇÃO

9.1 Plano além do que o painel espera

Tabela 13 - Alertas do plano

Nível	Descrição
médio	DEV-207: entrega em 13/11 passa da previsão do painel (11/11)
médio	Mariana Coutinho: 44h planejadas passam da capacidade de 40h
alto	DEV-198: entrega em 13/11 passa do vencimento do painel (12/11)

Fonte: plano da supervisão comparado ao painel.

9.2 Demandas em risco, atrasadas ou com previsão vencida

Tabela 14 - Demandas que pedem acompanhamento

Card	Etapa atual / responsável	Etapas	Previsão	Ritmo
DEV-222 Os alertas não estão sendo limpos de verdade. Ocorrido: te	Levantamento de requisitos Douglas Cerqueira	0/3	09/11/26	em risco
DEV-198 Na central do funcionário ter a opção de visualizar os exame	Modelagem Mariana Coutinho	2/15	11/11/26	em risco
DEV-207 Continuar checando os envios em produção com o Davi para ver	Implementação Rodrigo Cinelli	7/15	11/11/26	em risco
DEV-040 CIPA - votação eletrônica Funcionalidade de acompanhamento	Modelagem Mariana Coutinho	3/13	13/11/26	em risco

Fonte: painel do gestor.

10. RISCOS E PLANO B

Tabela 15 - Registro de riscos

Risco	Prob. / impacto	Plano B	Decisão necessária
DEV-198 pode passar do vencimento de 12/11 DEV-198 - Mariana Coutinho - gatilho: Sem definição do cliente até 10/11	alta / alto	Entregar só a visualização e deixar o download para a semana seguinte	Aceitar entrega parcial até 10/11/26

Fonte: supervisão.

11. COMPROMISSOS COM A GESTÃO

Dos 2 compromissos da semana anterior, 1 foi cumprido (50%).

Tabela 16 - Compromissos assumidos

Semana	Compromisso	Situação
02/11	Fechar testes do DEV-218	cumprido
02/11	Modelagem do DEV-198 pronta Cliente não definiu o escopo	não cumprido
09/11	DEV-198 em homologação até 12/11	em aberto

Fonte: supervisão.

12. CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS

12.1 Destaques da semana

- Fluxo de agendamento com CPF fechado (DEV-218 e DEV-219).

12.2 Decisões e apoio necessários da gestão

- Aceitar entrega parcial do DEV-198 até 10/11.

APROVAÇÃO

Elaborado por	Ciente
_____ Mariana Coutinho Supervisão de desenvolvimento	_____ Gestor da área
Data: ____/____/_____	Data: ____/____/_____

ANEXO A – PLANO DETALHADO DA SEMANA

Tabela 17 – Plano de Rodrigo Cinelli

Card	O que	Para quê	Até	Situação
DEV-219 Checar que tipo de bug é esse que identifica CPF inválido em	Concluir frente: Agendamento	Agendamento sem erro de CPF	10/11	feito
DEV-207 Continuar checando os envios em produção com o Davi para ver	Concluir implementação frente: Integrações	Envios em produção estáveis	13/11 era 11/11 passa do painel	a fazer
sem card	Correção urgente no login não planejado frente: Acesso		10/11	feito

Fonte: plano da supervisão.

Tabela 18 – Plano de Douglas Cerqueira

Card	O que	Para quê	Até	Situação
DEV-218 Realizar um agendamento novo com um CPF aleatório até o fim	Concluir testes frente: Agendamento	Fechar o fluxo de agendamento	10/11	feito
DEV-222 Os alertas não estão sendo limpos de verdade. Ocorrido: te	Levantamento de requisitos frente: Alertas		–	adiado

Fonte: plano da supervisão.

Tabela 19 – Plano de Mariana Coutinho

Card	O que	Para quê	Até	Situação
DEV-198 Na central do funcionário ter a opção de visualizar os exame	Concluir modelagem frente: Portal do funcionário	Liberar exames na central do funcionário	13/11 era 11/11 passa do painel	a fazer
DEV-223 Já deixar o PCMSO preenchido nos cronogramas.	Front-end frente: Cronogramas	PCMSO já sai pronto	12/11	feito
DEV-040 CIPA - votação eletrônica Funcionalidade de acompanhamento	Concluir modelagem frente: CIPA	Eleição da CIPA online	13/11	a fazer

Fonte: plano da supervisão.

ANEXO B – MOVIMENTO DOS CARDS

Tabela 20 – Cards que mudaram desde a semana de 02/11/26

Card	Etapas	Ritmo	Previsão
DEV-218 Realizar um agendamento novo com um CPF aleatório até o fim	10 > 13 de 15	no ritmo > no ritmo	10/11/26
DEV-198 Na central do funcionário ter a opção de visualizar os exame	2 > 2 de 15	no ritmo > em risco	11/11/26
DEV-207 Continuar checando os envios em produção com o Davi para ver	5 > 7 de 15	em risco > em risco	06/11 > 11/11

Fonte: painel do gestor.

Saíram da execução (concluídos ou pausados): DEV-150.

ANEXO C – GLOSSÁRIO DOS INDICADORES

Tabela 21 - Definições

Termo	Definição
Dentro do prazo (%)	Percentual das entregas concluídas no período que saíram até o vencimento, como calculado pelo painel do gestor.
Meta do painel (%)	Meta de entregas dentro do prazo definida no painel para o mês.
Concluídos	Itens do cronograma já concluídos, contados pelo painel.
Concluídas no período	Entregas concluídas na janela de tempo que o painel considera.
Demandas em andamento	Demandas com alguma etapa aberta no momento da foto do painel.
Ritmo	Classificação do painel para cada demanda em execução: no ritmo, em risco ou atrasada.
Atrasados (vencimento passou)	Itens ainda abertos cujo vencimento já passou.
Eficiência da área	Índice do painel composto por prazo, vazão e qualidade.
Itens feitos (plano)	Itens planejados pela supervisão para a semana que foram marcados como feitos.
Itens alterados	Itens do plano que foram adiados ou tiveram a data combinada mudada depois da confirmação.
Continuidade no cronograma	Das entregas feitas, quantas saíram até a previsão ou o vencimento do card no painel.
Desvio de entrega	Dias úteis entre a data combinada no plano e a entrega. Negativo significa entrega antecipada.
Utilização da capacidade	Horas planejadas divididas pela capacidade semanal das pessoas com plano.
n	Quantidade de semanas com o indicador registrado (uma foto por semana: a mais recente).
Média e mediana	Valor médio da série e valor central quando os valores são ordenados.
Desvio-padrão (DP)	Quanto os valores variam em torno da média (amostral). Faixa usual = média mais ou menos um DP.

Termo	Definição
Tendência por semana	Inclinação da reta de mínimos quadrados: quanto o indicador sobe ou desce, em média, a cada semana.

Fonte: supervisão.
